第２回　新名取市図書館施設整備検討委員会

日　時　平成 27 年 7 月 16 日（木）午後 3 時より
場　所　名取市図書館　南館

（次　第）

1　開　　会

2　あいさつ

3　前回会議の報告

4　議　　事

（1）２階フロアスペースの検討について

（2）その他

5　閉　　会

児童スペースの設備等の考え方


授乳室	・ベビーベッド、荷物置き、椅子 ・水廻りなし ・床仕上げ:ビニル床シート　壁仕上げ:塗装　天井仕上げ:ロックウール化粧吸音板
児童トイレ	・小便器(幼児用)1個、大便器(幼児用3～5才)1個 ・フィッティングボード、手洗い(高さを考慮)、鏡 ・床仕上げ:ビニル床シート　壁仕上げ:塗装　天井仕上げ:化粧石膏ボード
おはなしのへや	・床を1段上げる(100～150mm程度) ・床は清掃しやすい材質のもの(コルク等柔らかく暖かみがあるもの) ・収納庫をつける(引戸) ・壁面には丸い窓を互い違いに。(児童トイレ前の通路が見えるように) ・照明は調光器あり
書架・閲覧スペース	・床仕上げ:フローリング ・書架、椅子、机、カウンター:木製(高さ、デザインを考慮) ・書架:低書架(3段及び4段)、絵本架、大型絵本架、紙芝居架

カフェコーナーの設備等の考え方

カフェコーナー	・床仕上げ:フローリング(他のスペースとは色を変える。ダークな色調)　・壁仕上げ:塗装 ・照明は他のスペースと変える ・テーブル、椅子、展示棚、スクリーン、プロジェクター ・手洗い
カフェ(厨房)	・床仕上げ:ビニル床シート　壁仕上げ:塗装　天井仕上げ:化粧石膏ボード ・造付カウンター ・システムキッチン(IHやガスコンロなし、吊戸棚付)、ガス湯沸器、作業台　子メーター

ブラウジングコーナー(新聞・雑誌のスペース)の設備等の考え方

ブラウジングコーナー	・床仕上げ:フローリング ・新聞架、新聞収納棚、雑誌架、机、椅子等 ・明るく開放的で、ゆったりとくつろげる雰囲気に

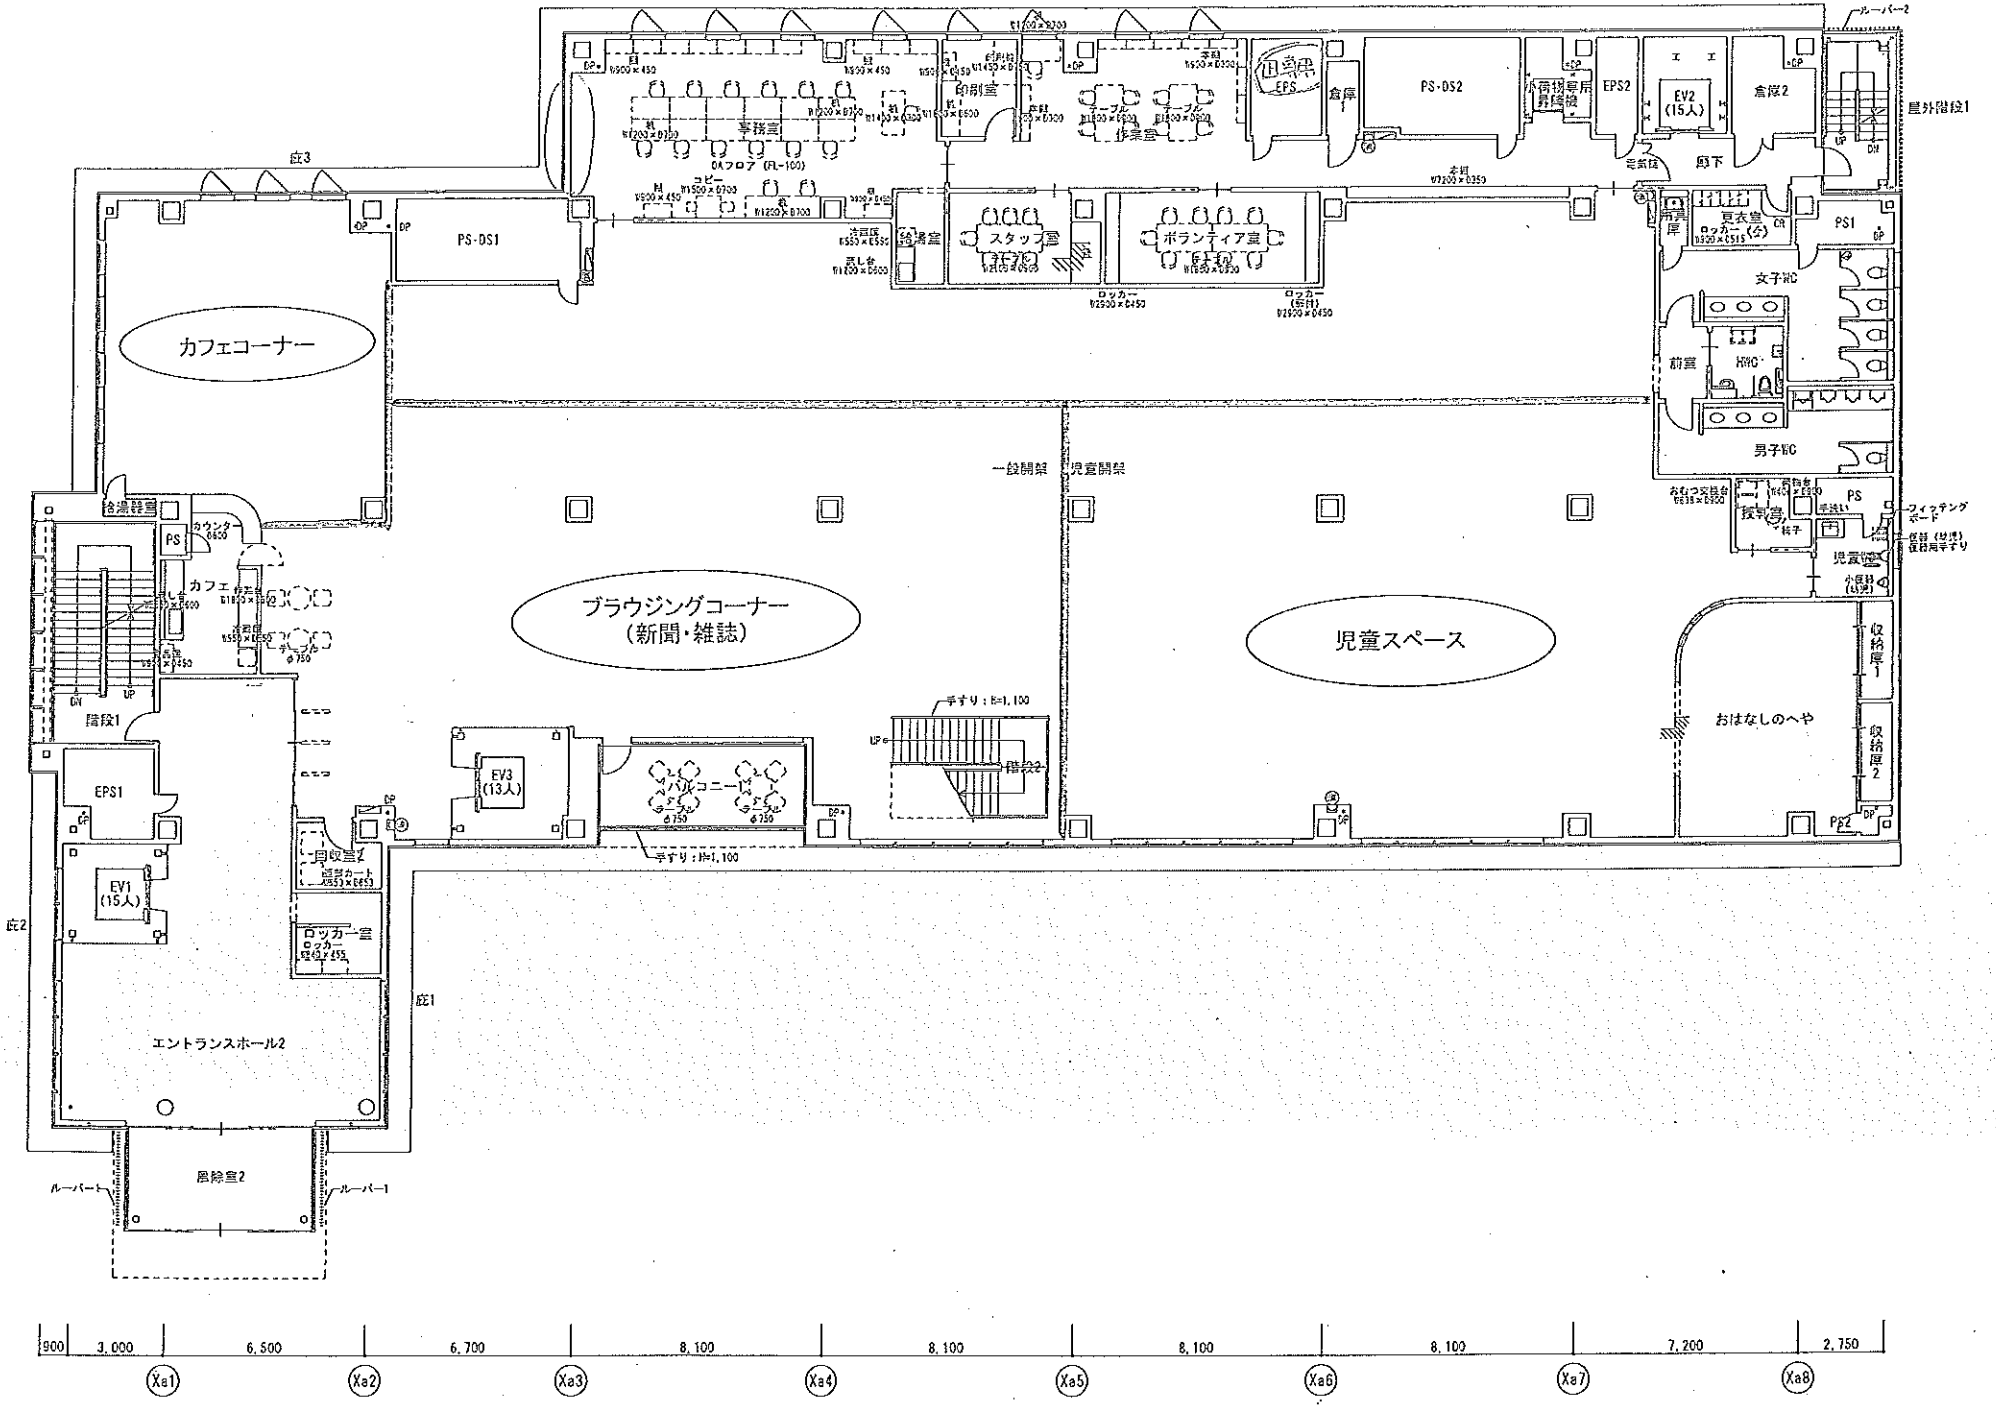

名取駅前地区第一種市街地再開発事業

A棟（図書館）　2階平面図

（イメージ案）

Sca

庇3

DP

PS・DS1



カフェコーナー





給湯器室

PS

カウンター
D600

カフェ

作業台
W1800×D600

流し台
W2550×D600

冷蔵庫
W550×D550

食品庫
W900×D450

テーブル
φ750

DN

UP

階段1

EPS1

DP

EV1
(15人)

回収室

返却カート
W653×D653

DP

消

EV3
(13人)

バルコニー


テーブル
φ750


テーブル
φ750

DP

手すり：H=1,100









児童開架



UP

階段2

OAフロア（FL-100）

机
W1200×D700

机
W1200×D700

務室

机
W1400×D700

机
W1800×D600

印刷室

本棚
W900×D300

テーブル
W1800×D900

作業室

棚
W900×450

コピー
W1500×D700

机
W1200×D700

棚
W900×D450

冷蔵庫
W550×D550

流し台
W1200×D600


給湯室

スタッフ室

テーブル
W2100×D900

ロッカー
W2900×D450

（イメージ案）

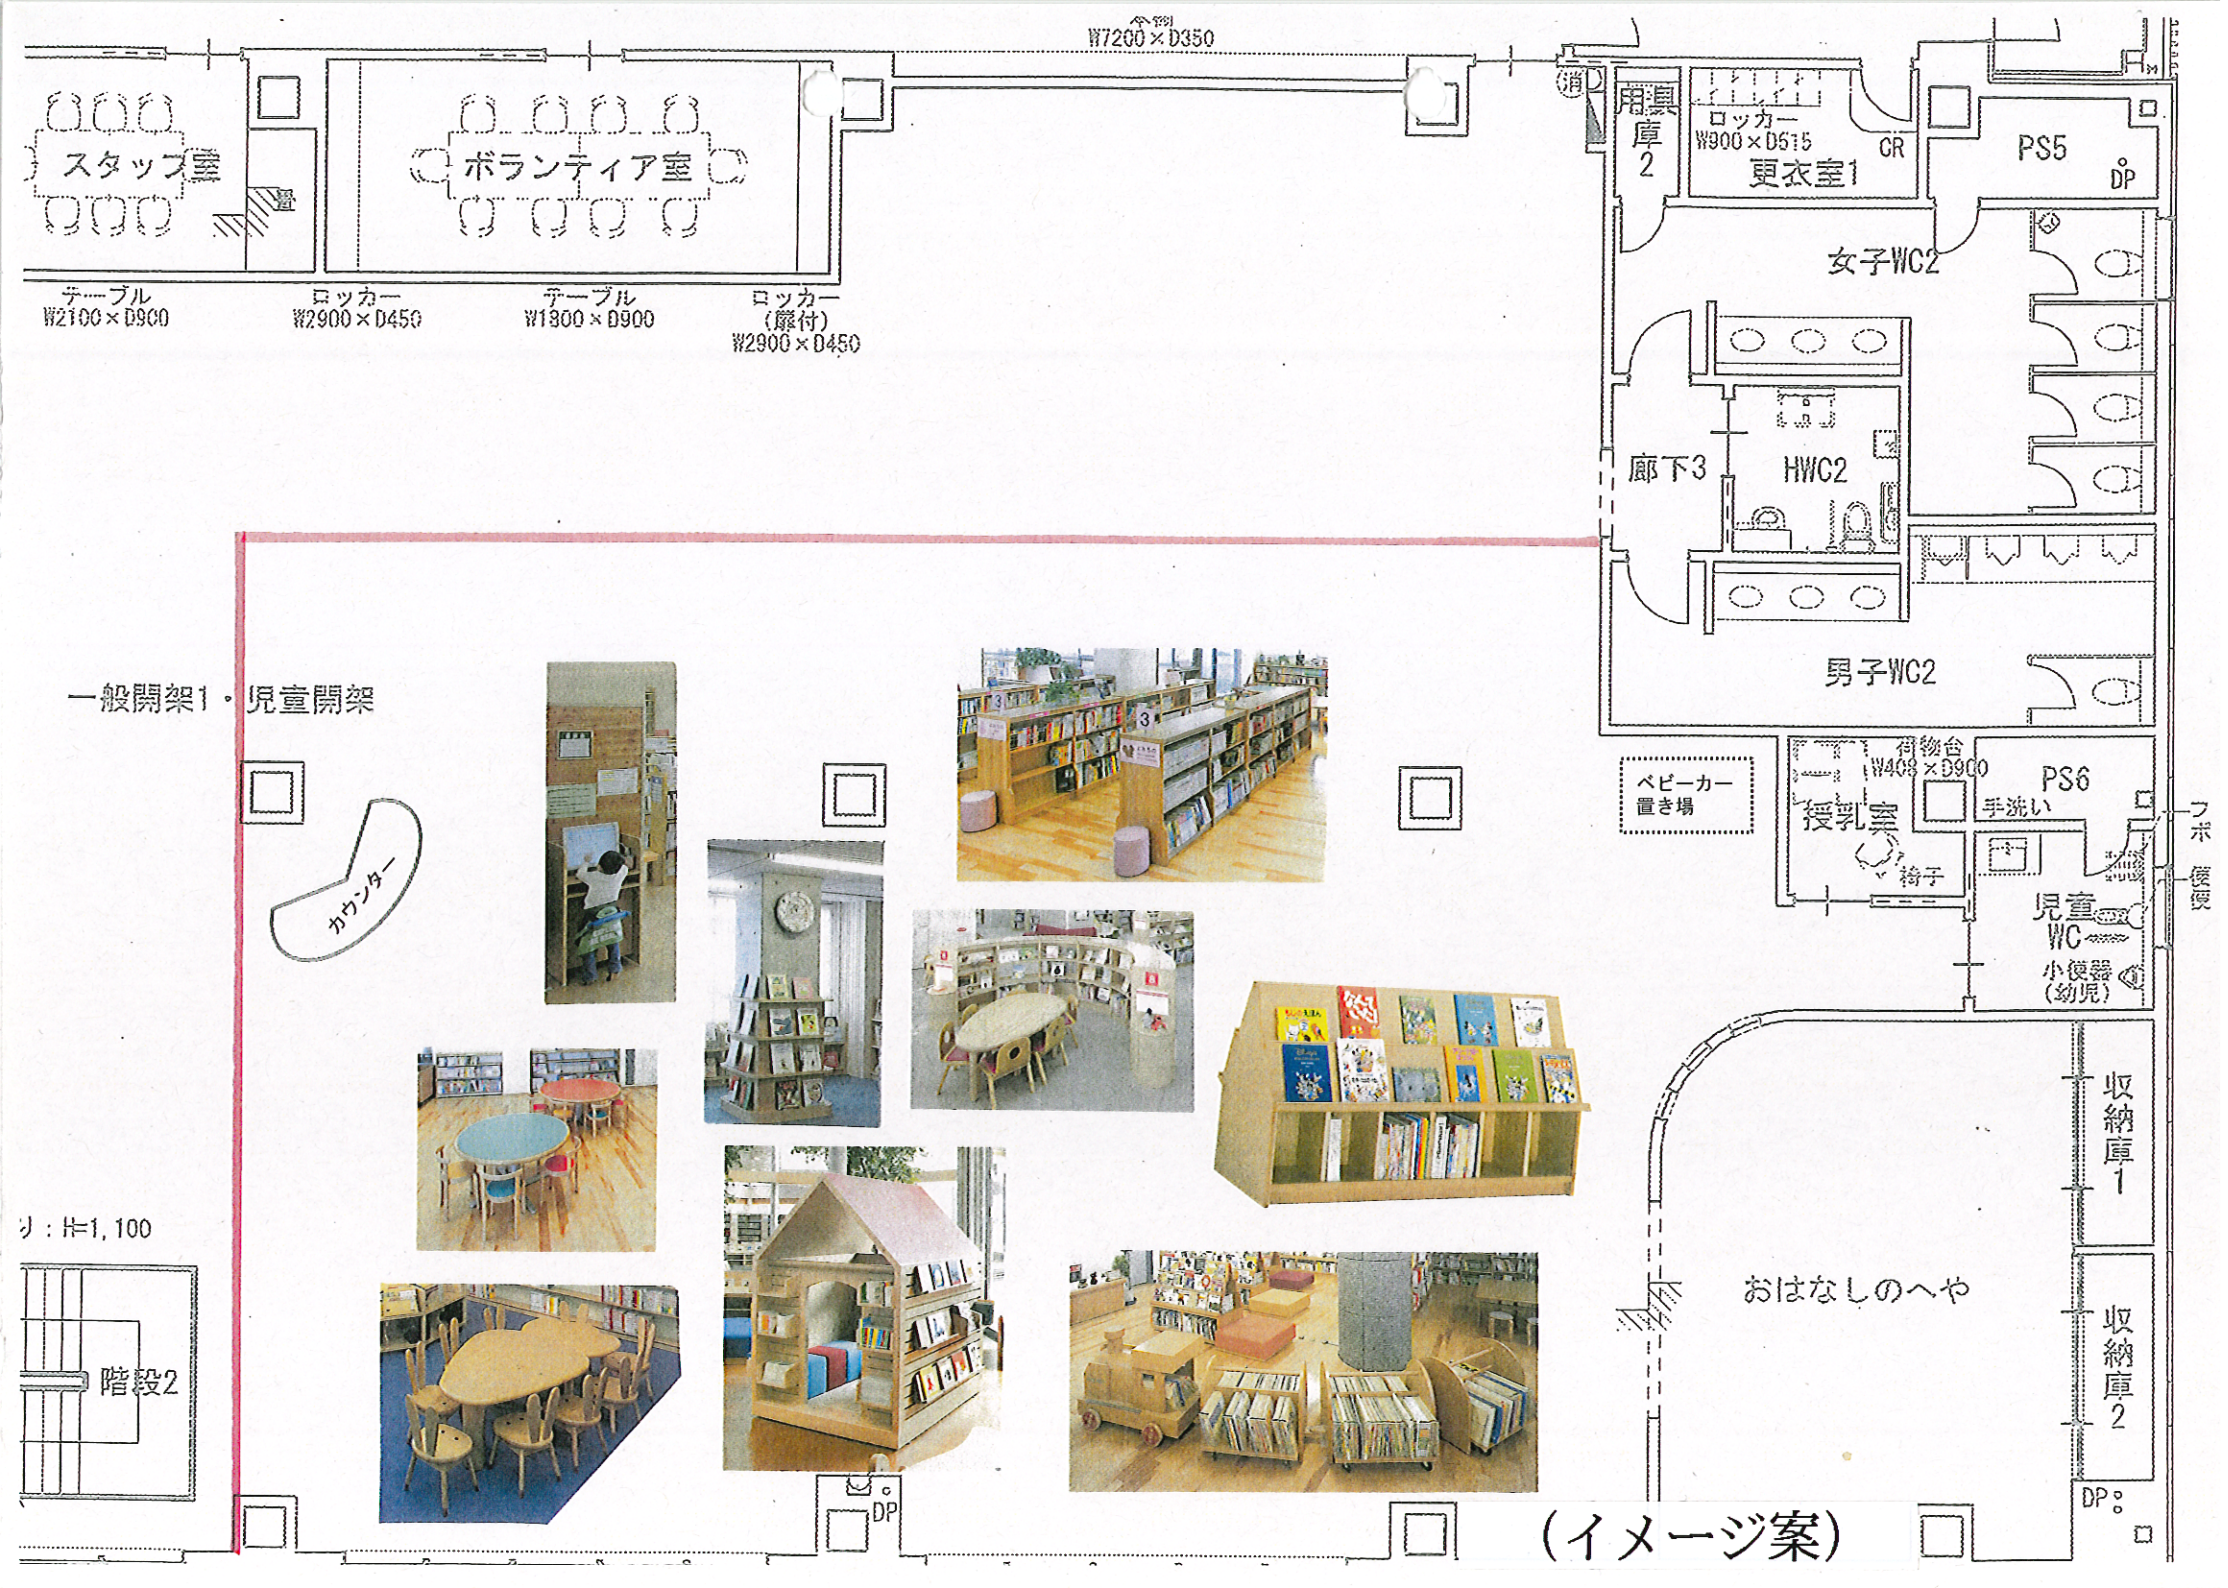
W7200×D350
スタッフ室
ボランティア室
テーブル W2100×D900
ロッカー W2900×D450
テーブル W1800×D900
ロッカー (扉付) W2900×D450
用具庫2
ロッカー W900×D515
更衣室1
CR
PS5
DP
女子WC2
廊下3
HWC2
男子WC2
ベビーカー置き場
荷物台 W400×D900
PS6
手洗い
授乳室
椅子
児童WC
小便器(幼児)
フポ
便器
収納庫1
収納庫2
おはなしのへや
DP
一般開架1・児童開架
カウンター
階段2
(イメージ案)
